

Timeline & Skenario Delivery — FINAL


Squad Diperkuat, 2 Rilis

Man Power & Man Hours + Area of Unit (gabungan) → Maintenance Activity Type + My Work & eMAR

Tanggal	3 Agustus 2026 (revisi scope Rilis 2: 13 Agustus 2026)
Produk	Digiman+
Cakupan	Man Power & Man Hours, Area of Unit/Component/Sub Component (Rilis 1 — digabung), Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order + My Work & eMAR (Rilis 2)
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen turunan dari	squad-baru-release-timeline.md (Skenario A) — hasil diskusi bertahap skenario alternatif, keputusan final 3 Agustus 2026

RENCANA DELIVERY FINAL — SQUAD DIPERKUAT (7 ORANG / 19 MINGGU)

1. Ringkasan Skenario



UPDATE 13 AGUSTUS 2026 — SCOPE RILIS 2 DIPERLUAS

Rilis 2 sekarang juga mencakup **My Work & eMAR** (*Electronic Mechanic Activity Report*) — ship bersamaan dengan Maintenance Activity Type, bukan rilis terpisah. Total SP Rilis 2 naik dari 48 → **161 SP** (BE 28→75, FE 9→47, QA 8→28, Dashboard 3→11). Estimasi ship awalnya Minggu 18, lalu direvisi ke **Minggu 19** setelah capacity check per-orang (lihat callout di bawah).

Perbandingan "-7 minggu vs Skenario A" pada rencana sebelumnya **tidak lagi apple-to-apple** — Skenario A (19 minggu) tidak pernah mencakup My Work/eMAR, tidak direcompute di sini. Yang mencolok: total proyek sekarang **19 minggu — sama persis dengan Skenario A** (4 orang, 3 rilis sequential), meski Skenario A tidak pernah membawa scope My Work/eMAR. Bukan berarti squad diperkuat sia-sia (Skenario A akan lebih lambat lagi kalau My Work/eMAR ditambahkan ke dalamnya juga) — tapi benefit "lebih cepat dari Skenario A" yang jadi justifikasi awal keputusan 7 orang praktis hilang begitu Rilis 2 diperluas. Detail breakdown ada di Bagian 4.

CAPACITY CHECK (13 AGUSTUS 2026, REVISI KEDUA) — JADWAL DIREVISI MINGGU 18 → 19

Bar Gantt awal digambar per-kategori tanpa cross-check jumlah thread konkuren terhadap headcount riil (3 BE, 2 FE) — hasilnya di Minggu 8–10 ada sampai 4 thread BE/FE "paralel" sekaligus, padahal orangnya cuma 3/2. Setelah dijadwal ulang mengikuti kapasitas riil (tabel alokasi per-orang di Bagian 4): Activity Type prioritas Minggu 8–10 (~2 dari 3 BE), eMAR mulai Minggu 9 (1 BE bebas), **My Work baru mulai penuh Minggu 11** (nunggu Activity Type melepas kapasitas) — BE & FE baru selesai ~Minggu 15, bukan 13–14. **Total SP tidak berubah (161 SP)** — cuma timing yang dikoreksi.

Squad	7 orang — diperkuat dari 4: 3 Backend, 2 Frontend Fullstack (Web+Mobile, tugas dibagi bebas), 2 QA
Rilis	2 rilis (bukan 3): Rilis 1 = Man Power, Duration & Man Hours + Area of Unit, Component & Sub Component (digabung). Rilis 2 = Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order + My Work & eMAR (ditambahkan 13 Agustus 2026 — lihat Bagian 4)
Velocity	Sama seperti Skenario A: ramp-up 0.81 SP/hari/orang (Sprint 1–2, Minggu 1–4), full speed 0.85 SP/hari/orang (Sprint 3 dst, Minggu 5+)
Antar-rilis	Freeze code penuh — Rilis 2 tidak dimulai sebelum Rilis 1 ship (tidak ada BE yang nyicil kerjaan Rilis 2 selama Rilis 1 berjalan)

QA	Mulai bertahap (shift-left) — testing modul yang sudah code-complete duluan, bukan menunggu 100% dev rilis selesai
Release Preparation	1 minggu per rilis (2×1 minggu = 2 minggu total)

Kenapa 3 Backend — Bukan Cukup Nambah FE/QA Saja

Dari eksplorasi skenario headcount sebelumnya: menambah FE dan QA saja (tanpa nambah BE) tidak cukup untuk kompresi signifikan **selama freeze code diberlakukan** (tidak ada cicil antar rilis) — karena BE (2 orang) selalu jadi *critical path* di tiap rilis, FE/QA ekstra cuma menunggu BE selesai duluan. BE harus ikut ditambah supaya benar-benar berhenti jadi bottleneck di kedua rilis.

Kenapa ~12 → 19 Minggu — Perjalanan Angkanya

Estimasi awal skenario final (13 minggu) mengasumsikan QA baru mulai setelah **100% dev rilis selesai** ("big bang" testing). Realistisnya, task-task dalam satu rilis tidak semua selesai di hari yang sama — beberapa modul (Inspection, Order Approval, Master Data) code-complete lebih dulu daripada modul terbesar (Digiplan/SAP Sync). QA tidak perlu menunggu modul terakhir selesai untuk mulai testing modul yang sudah jadi — testing bertahap (shift-left) ini awalnya memangkas ~1 minggu di tiap rilis (13→11 minggu).

REVISI 3 AGUSTUS 2026

1 minggu buffer dikembalikan **khusus ke Rilis 1** — QA end-to-end tetap mulai bertahap (shift-left, Minggu 2), tapi durasi kalendernya dilonggarkan lagi supaya Rilis 1 ship di Minggu 7, sama seperti tanggal ship Man Power standalone di Skenario A. Rilis 2 **tidak** diberi buffer tambahan — tetap shift-left penuh, cuma bergeser mengikuti mundurnya Rilis 1. Hasil akhir: **~12 minggu total** (13→11→12), tetap hemat 7 minggu dari Skenario A, dengan Rilis 1 punya margin keamanan lebih besar dibanding Rilis 2.

REVISI 13 AGUSTUS 2026

Rilis 2 diperluas mencakup My Work & eMAR (113 SP baru: 27 BE + 18 FE My Work, 20 BE + 20 FE eMAR, 20 SP QA tambahan, 8 SP DE/DA tambahan). QA juga direvisi mulai **paralel dari Minggu 8** (test case design/test plan sejak hari pertama dev, bukan menunggu modul pertama code-complete) — SP QA awal naik dari 2 → 10 SP (11.7 mandays), tetap dihitung penuh di total mandays, bukan sekadar catatan kualitatif. Fase dev+QA Rilis 2 naik dari 4 → 11 minggu — didorong dua item BE terberat (auto-match engine My Work, 8 SP; integrasi DWS eMAR, 5 SP), fase QA end-to-end yang sekarang menguji 3 alur sekaligus (Activity Type + My Work + eMAR), dan koreksi capacity check per-orang (lihat callout revisi kedua di atas). Rilis 1 tidak terdampak. Hasil akhir: **~19 minggu total** — breakdown lengkap ada di Bagian 4.

Metodologi Estimasi

SP & mandays memakai metodologi yang sama dengan Skenario A — kalibrasi Fibonacci [1,2,3,5,8] per komponen kerja. Yang berbeda: skenario **squad diperkuat 7 orang** (bukan 4), **2 rilis** (bukan 3, Rilis 1 & 2 Skenario A digabung), dan **QA shift-left** (mulai bertahap per modul, bukan big-bang di akhir).

Master Timeline (~19 Minggu, direvisi 13 Agustus 2026)

Minggu	Rilis	Fase
1–6	Rilis 1 (Man Power + Area)	Dev + QA (QA mulai bertahap dari Minggu 2, +1 minggu buffer)
7	Rilis 1	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 7
8–18	Rilis 2 (Maintenance Activity Type + My Work + eMAR)	Dev + QA (QA mulai paralel dari Minggu 8; My Work BE baru mulai penuh Minggu 11 — lihat capacity check; fase end-to-end diperpanjang ke Minggu 15–18)
19	Rilis 2	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 19


Rilis 1 ship di **Minggu 7** — persis sama dengan tanggal ship Man Power *standalone* di Skenario A (yang cuma bawa 1 fitur dengan tim 4 orang). Trade-off "Man Power mundur" dari Skenario B/C tetap hilang (tidak mundur) meski sekarang tidak lebih cepat juga — 1 minggu buffer QA dikembalikan sebagai margin keamanan (keputusan 3 Agustus 2026). Rilis 2 (scope Maintenance Activity Type awal) tidak diberi buffer tambahan, hanya bergeser +1 minggu mengikuti mundurnya Rilis 1 — lihat Bagian 4 untuk breakdown lengkap penambahan My Work & eMAR dan capacity check per-orang yang mendorong ship ke Minggu 19.


2. Gantt Chart — Timeline 2 Rilis

VERSI INTERAKTIF TERSEDIA

Tabel statis di bawah ini untuk referensi cetak. Untuk versi **live/interaktif** (hover tooltip per task, dark mode, toggle tabel) lihat: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204

Bar QA digambar 2 pola: QA awal (bergaris, warna hijau sama dengan QA end-to-end) untuk test case design & testing modul yang sudah code-complete duluan, QA end-to-end (solid) untuk testing yang butuh integrasi penuh siap dulu — keduanya dihitung penuh di total mandays. Rilis 1 pakai +1 minggu buffer di fase end-to-end (ship Minggu 7); Rilis 2 (revisi) fase end-to-end memanjang jadi 4 minggu (Minggu 15–18) karena menguji 3 alur sekaligus dan baru bisa mulai setelah BE/FE My Work & eMAR benar-benar selesai — lihat § "Kenapa ~12 → 19 Minggu" di Bagian 1.

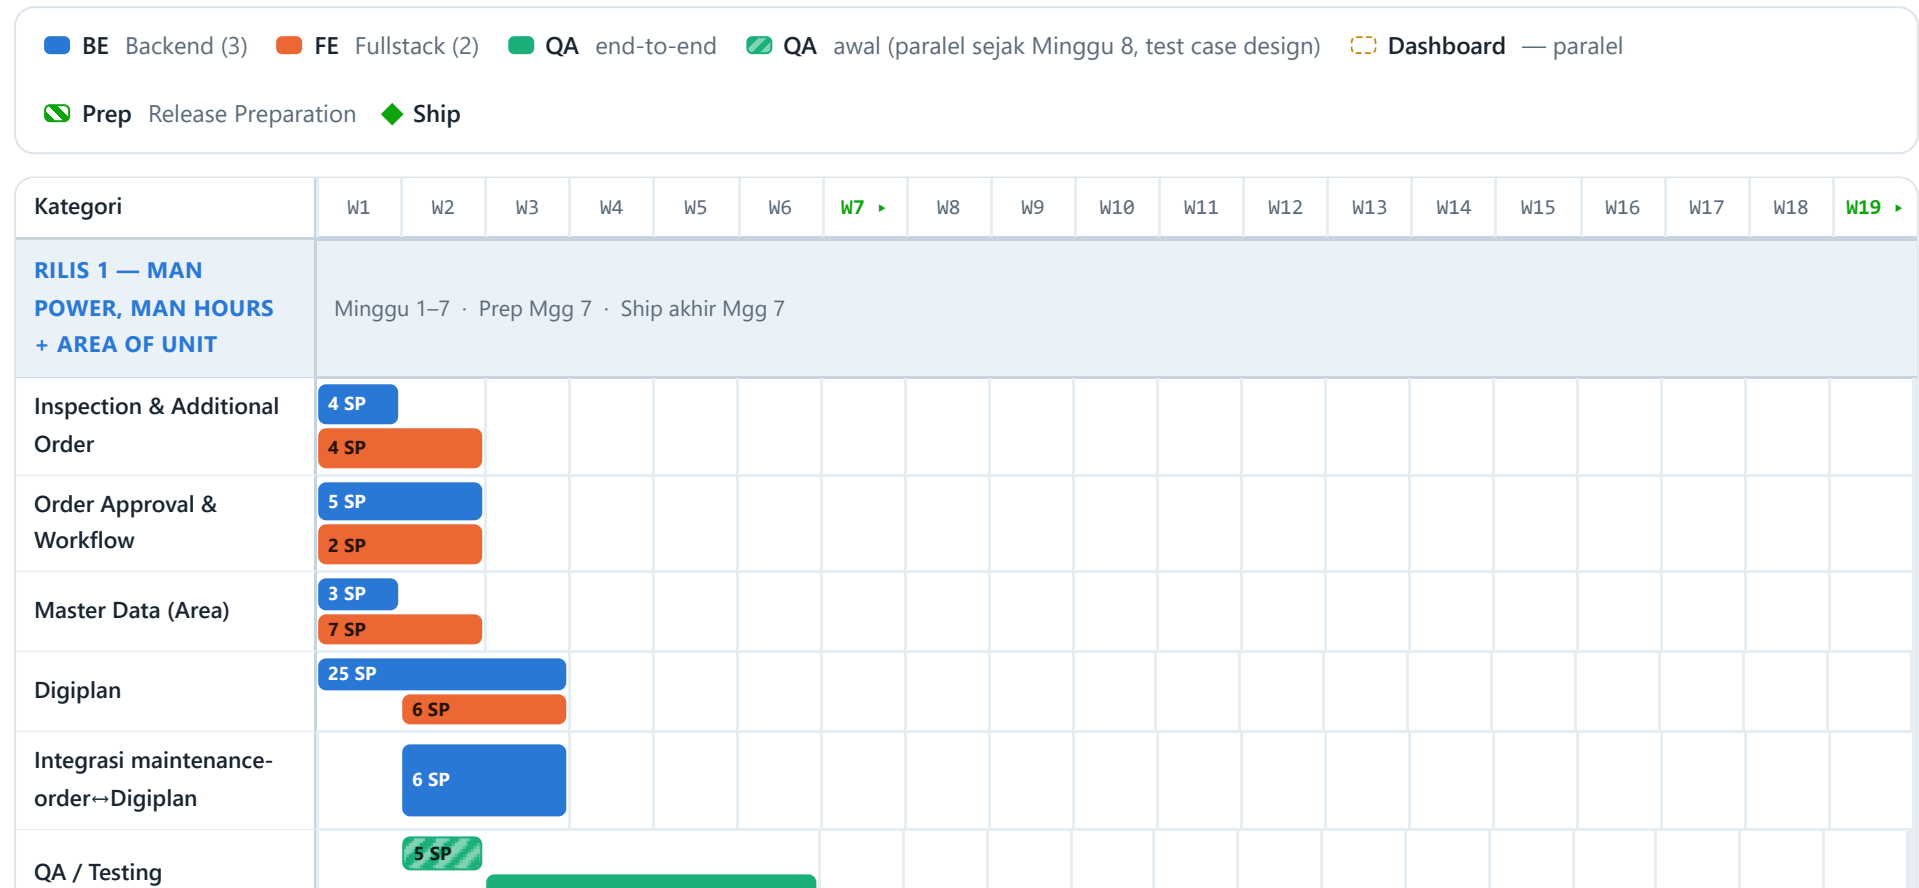

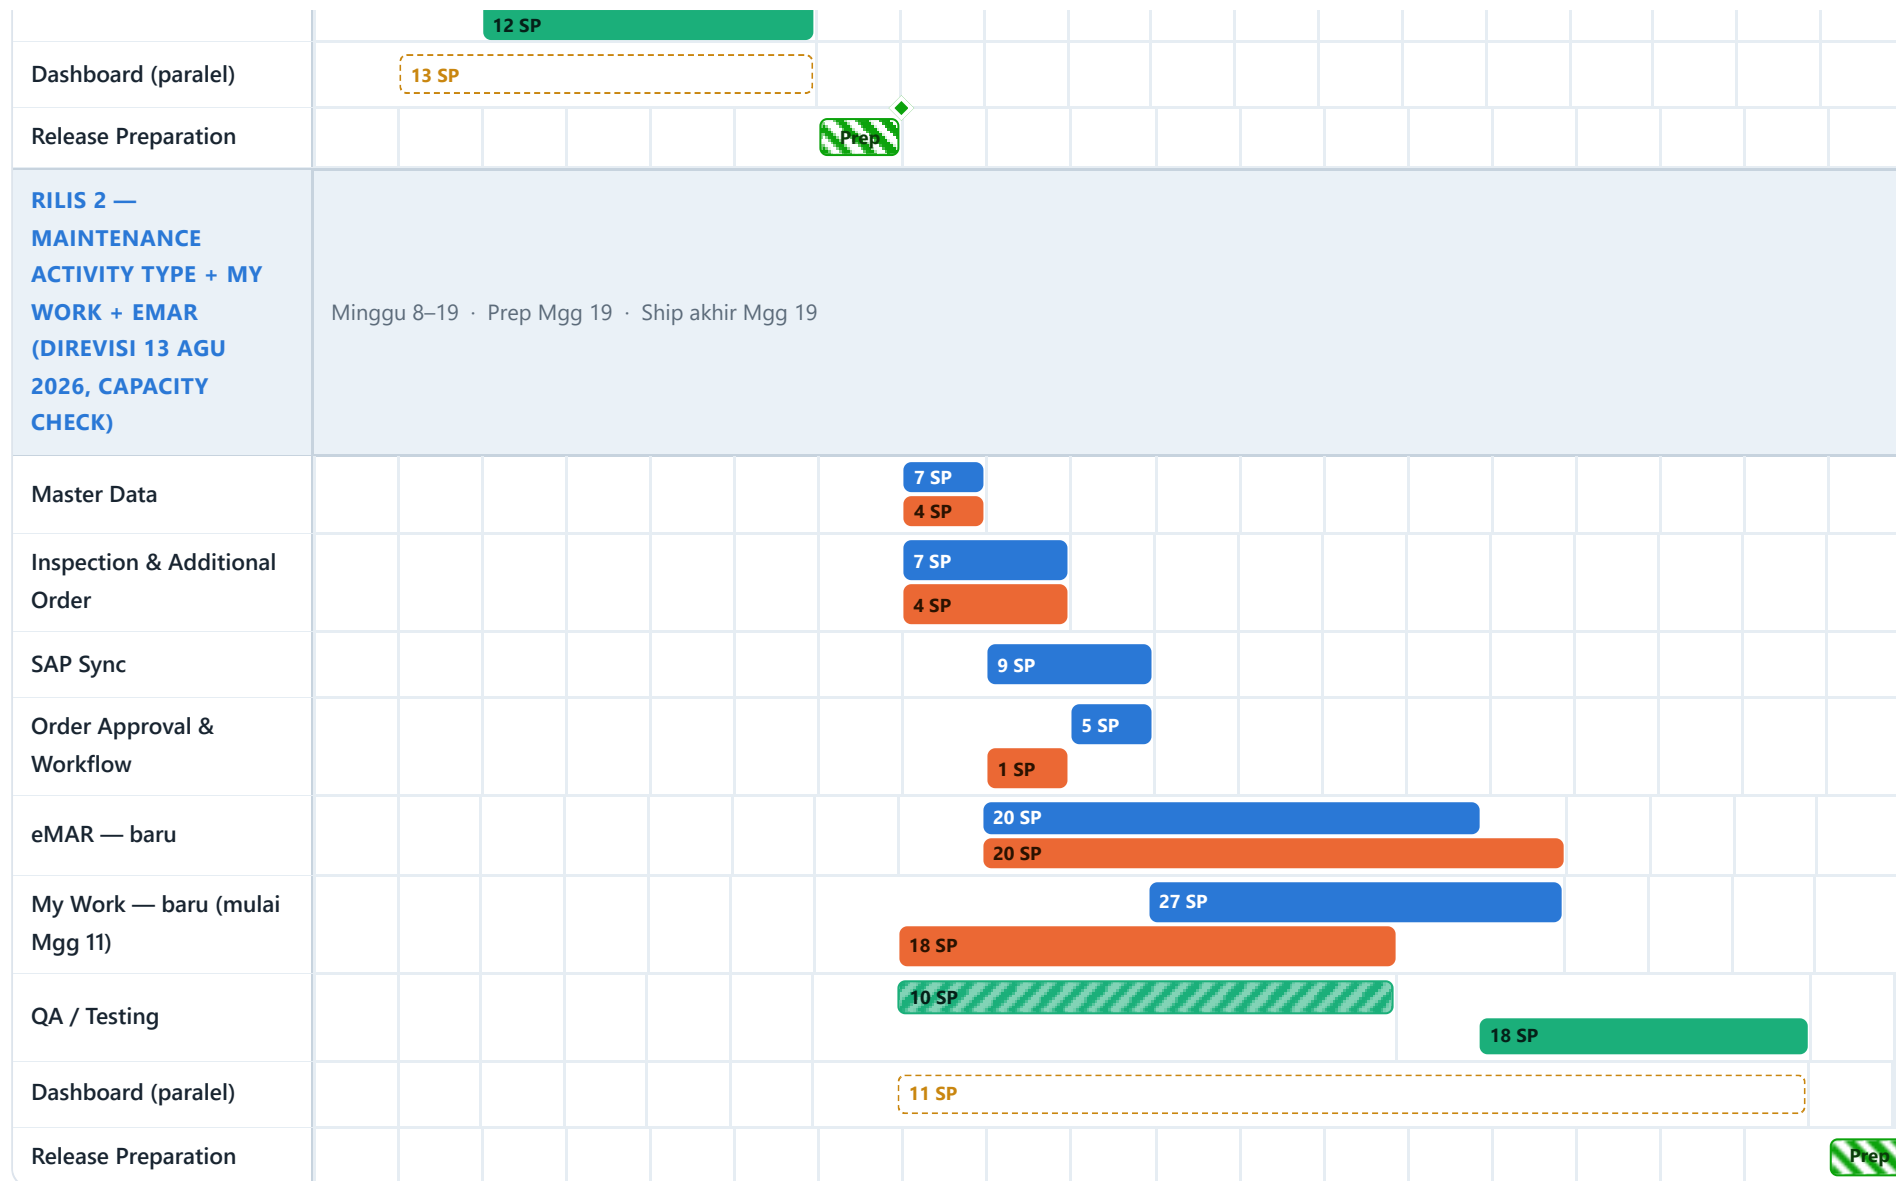

Dashboard (DE/DA) berjalan paralel di kapasitas resource terpisah — tidak memperebutkan kapasitas squad 7 orang.

3. Rilis 1 — Man Power, Man Hours + Area of Unit (Minggu 1–7)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Inspection & Additional Order	Field Man Power (Inspection/Add. Inspection, Additional Order) — Duration di kedua layar sudah ada, bukan scope baru	BE	2	2.5
Inspection & Additional Order	Field Man Power UI	FE	4	4.9
Inspection & Additional Order	BE derive + snapshot AreaCode / AreaName	BE	2	2.3
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Man Power/Duration	BE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Component/SubComponent	BE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Edit Man Power/Duration UI di Order Approval	FE	2	2.5
Master Data	Master data Area CRUD + Equipment Mapping modal (AreaCode)	FE	7	8.2
Master Data	Data migration backfill AreaCode + permission code	BE	3	3.5
Digiplan	Grid recalculate, Excel export/import, rollup, assessment formula (termasuk logic PM Shutdown/BD Corrective)	BE	17	21.0
Digiplan	Guardrail Template Config UI, grid Man Hours read-only	FE	3	3.7
Digiplan	Grid UI: 3 dropdown cascading Area→Component→SubComponent	FE	3	3.5
Digiplan	DPColumn 3 kolom baru, Excel export/import+validasi	BE	8	9.4
Integrasi maintenance-order ↔ Digiplan	PoolingMOItem : kolom Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-	PoolingMOItem : kolom Area	BE	1	1.2

order ↔Digiplan

Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Area	BE	1	1.2
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan + PM/BD (Man Power)	QA	11	12.9
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan (Area)	QA	6	7.0
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Man Power+Area) + Power BI	DE/DA	13.0	15.2
Total BE: 43 SP / 51.8 mandays · FE: 19 SP / 22.8 mandays · QA: 17 SP / 19.9 mandays · DE/DA (paralel): 13 SP / 15.2 mandays				

QA SHIFT-LEFT

QA (2 orang) mulai bertahap: Minggu 2 — functional testing modul yang sudah code-complete duluan (Inspection, Order Approval, Master Data) ~5 SP. Minggu 3–6 — testing end-to-end yang butuh Digiplan+Integrasi siap dulu (selesai Minggu 3) ~12 SP sisanya, **+1 minggu buffer** ditambahkan di sini sebagai margin keamanan (keputusan 3 Agustus 2026).

DEPENDENCY

Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh — sequencing internal Rilis 1, bukan lagi soal urutan rilis.

BENEFIT KE CUSTOMER

SPV bisa estimasi kebutuhan tenaga kerja (Man Power) sejak Order dibuat, Man Hours terhitung otomatis di Digiplan. Planner/SPV bisa mencatat & memfilter pekerjaan berdasarkan lokasi kerja (Area, Component, Sub Component) — konsisten di semua jalur order, kedua fitur ship bersamaan.

4. Rilis 2 — Maintenance Activity Type + My Work & eMAR (Minggu 8–19, direvisi 13 Agustus 2026)

4.1 Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (scope awal)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	MaintenanceActivityType schema/API + mapping M:N + permission + seeder	BE	7	8.2
Master Data	Master Data CRUD UI + Mapping UI	FE	4	4.7
Inspection & Additional Order	Extend submit Inspection (snapshot) + resolusi InspectorName	BE	7	8.2
Inspection & Additional Order	Additional Order Screen 1&2, Order Details — dropdown Activity Type	FE	4	4.7
Order Approval & Workflow	Order Approval — dropdown Activity Type	FE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Standardisasi ReferenceTransactionId + dual-lookup 3 endpoint	BE	5	5.9
SAP Sync	MechanicOrderList kolom baru + extend PoolingMOItem	BE	3	3.5
SAP Sync	4 endpoint cleanup (order-detail/assetnumber/approve/deprecate)	BE	6	7.0
Subtotal scope awal — BE: 28 SP / 32.8 mandays · FE: 9 SP / 10.5 mandays				

4.2 My Work & eMAR (baru, ditambahkan 13 Agustus 2026)

Confidence lebih rendah dari 4.1 — tidak ada reference class Jira (fitur belum pernah dibangun), beberapa keputusan desain masih terbuka (lihat callout risiko di bawah tabel). Detail per item: `my-work.md`, `mechanic-activity-report.md`, `mechanic-productivity-management.md`.

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
My Work	UserActivityLog schema (3) + unified feed API (5) + CRUD manual activity (3) + confirm actual done (2) + Fit to Work/gating (2) + unit/WO search (3) + auto-match engine lintas service (8) + permission/homepage (1)	BE	27	31.6

My Work	Home hari ini + navigasi tanggal (4) + detail assignment (2) + form tambah non-maintenance (2) + form ad-hoc maintenance+unit picker (3) + edit/delete manual (1) + layar Fit to Work+blocked state (2) + konfirmasi actual (1) + prompt auto-match (2) + empty/offline state (1)	FE	18	21.1
eMAR	Report envelope+migration (3) + Submit API (5) + Approve/Reject API (2) + baseline hours config (2) + integrasi DWS dp1an.Dws (5) + approver queue API (2) + riwayat report API (1)	BE	20	23.4
eMAR	Mobile: list bulanan+day detail+ganti periode+riwayat+rejected-resubmit+submit confirm (13). Web: approver detail/approve-reject+inbox/queue+admin baseline config (7)	FE	20	23.4
QA / Testing	QA awal — mulai paralel sejak Minggu 8 (test case design & test plan, bukan menunggu modul pertama code-complete): Master Data & Inspection Activity Type existing (2) + eMAR mobile UI & layar My Work non-integrasi begitu siap (8)	QA	10	11.7
QA / Testing	QA end-to-end — create→approve→SAP sync Activity Type existing (6) + self-capture→confirm→auto-match My Work + submit→approve→reject eMAR + validasi Utilization Rate via DWS (12)	QA	18	21.1
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard Maint. Act. Type existing (3) + Mechanic Productivity Dashboard baru — Site Manager & HO, drilldown Site→Section→Level→Individual (8), Power BI	DE/DA	11	12.9
Total Rilis 2 (gabungan) — BE: 75 SP / 87.8 mandays · FE: 47 SP / 55.0 mandays · QA: 28 SP / 32.8 mandays (10 SP/11.7 mandays QA awal + 18 SP/21.1 mandays QA end-to-end, keduanya terhitung penuh) · DE/DA (paralel): 11 SP / 12.9 mandays				

QA SHIFT-LEFT (REVISI 13 AGUSTUS 2026)

QA (2 orang) mulai **paralel sejak Minggu 8** — test case design & test plan dikerjakan sejak hari pertama dev, bukan menunggu modul pertama code-complete. Minggu 8–13 — QA awal (test case design + functional testing modul code-complete duluan) ~10 SP / 11.7 mandays. Minggu 15–18 — QA end-to-end (create→approve→SAP sync Activity Type + self-capture→confirm→auto-match My Work + submit→approve→reject eMAR + validasi Utilization Rate DWS) ~18 SP / 21.1 mandays. Mulai Minggu 15 (bukan 14) — lihat capacity check di bawah.

DI LUAR 113 SP MY WORK & EMAR (BELUM DIESTIMASI)

Push-assignment Foreman→Mechanic (My Work saat ini pull/self-assign) · split Man Power/Man Hours per-individu mechanic (tergantung enhancement lain) · notification service (dependency platform belum dikonfirmasi ada) · export PDF/Excel eMAR · GPS/location My Work. Kalau salah satu masuk scope belakangan, 161 SP di atas perlu direvisi naik.

4.3 Revisi Capacity Check (13 Agustus 2026, revisi kedua)

Estimasi BE/FE di 4.2 awalnya digambar per-kategori dengan tanggal dihitung independen dari $SP \div velocity$ masing-masing — **tanpa cross-check berupa kategori berjalan bersamaan pada minggu yang sama terhadap headcount riil**. Hasilnya: di Minggu 8–10 ada sampai **4 thread BE dan 4 thread FE "paralel"**, padahal squad cuma 3 BE / 2 FE — tidak bisa dieksekusi seperti itu. Jadwal ulang di bawah mengasumsikan **reallocation aktif** (orang pindah bantu thread lain begitu thread-nya sendiri selesai, bukan silo tetap 1 orang 1 fitur).

Lane	Thread	SP	Minggu	Catatan
BE-1	Activity Type (Master Data 7 + Inspection 7 + SAP Sync 9 + Order Approval 5)	28	8–10	Dibantu ~2 BE lain sebentar di Minggu 8–9 supaya tetap selesai secepat rencana awal
BE-2	eMAR (envelope, Submit/Approve API, baseline config, DWS, approver queue, riwayat)	20	9–14	Mulai Minggu 9 — Activity Type belum butuh 3 BE penuh, 1 BE bebas
BE-3	My Work (schema, feed API, CRUD, confirm, Fit to Work, unit/WO search, permission, auto-match)	27	11–15	Baru mulai penuh Minggu 11 — nunggu Activity Type (selesai ~Mgg 10) melepas 2 BE untuk bantu. Auto-match (8 SP) juga butuh Inspection Activity Type stabil dulu (selesai ~Mgg 9, bukan bottleneck tambahan)

FE-1	Activity Type FE (9) → lanjut eMAR FE (20)	29	8–9, lalu 9–15	1 lane berkelanjutan (bukan 2 orang beda) — Activity Type FE kecil & cepat, langsung lanjut eMAR FE
FE-2	My Work FE (Home, navigasi tanggal, detail assignment, form manual, Fit to Work, dst.)	18	8–13	Dedicated solo dari Minggu 8, tidak terdampak capacity check

Maks 3 BE dan 2 FE konkuren di setiap minggu ✓ (sebelumnya sampai 4). **BE & FE baru benar-benar selesai ~Minggu 15** (naik dari estimasi awal Minggu 13–14) — My Work FE sendiri tetap selesai ~Minggu 13 seperti rencana awal karena FE-2 dedicated sejak awal, tapi QA end-to-end tetap harus menunggu eMAR FE (FE-1, ~Mgg 15) dan My Work BE (BE-3, ~Mgg 15) sebelum bisa mulai penuh. **Total SP tidak berubah (161 SP)** — murni koreksi timing. Dampak: QA end-to-end mundur ke Minggu 15–18, Release Prep mundur ke Minggu 19, ship mundur dari Minggu 18 → **Minggu 19**.

BENEFIT KE CUSTOMER

Kegagalan create MO ke SAP akibat kombinasi Order Type+Activity Type yang salah-derive **berhenti** — Activity Type sekarang bisa dikonfigurasi fleksibel per Order Type oleh client sendiri. My Work memberi Mechanic/Foreman satu layar untuk melihat assignment harian dan mencatat aktivitas (termasuk fit to work); eMAR mengubah proses activity report bulanan dari manual jadi tercatat sistem dengan approval Supervisor dan dashboard produktivitas untuk Site Manager/HO.

5. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Headcount naik 75% (4→7 orang)** — keputusan komersial, biaya squad naik signifikan dari baseline 4 orang. Perlu persetujuan budget terpisah dari komitmen awal (8 sprint, tim 4 orang).
2. **Velocity ramp-up (0.81→0.85 SP/hari/orang) belum tervalidasi untuk kohort 7 orang baru sekaligus.** Angka ini dikalibrasi untuk skenario 4 orang menerima Knowledge Transfer dari tim BUMA ID veteran. Menaikkan jadi 7 orang berarti bandwidth KT tim veteran juga perlu di-scale — risiko ini diketahui dan sengaja dikesampingkan dalam pemodelan ini (keputusan 3 Agustus 2026), bukan tervalidasi tidak berdampak.
3. **Hiring lead time** untuk net tambahan +1 BE, +1 FE, +1 QA (di luar 4 orang existing) di luar estimasi 19 minggu ini — waktu rekrutmen/interview/notice period akan mengulur tanggal mulai Sprint 1.
4. **Risiko koordinasi/merge-conflict lebih tinggi** di 4 titik shared-screen Rilis 1 (eMOL carry-forward, PoolingMOItem, Digiplan grid/export, MO Backlog JOIN) karena sekarang dikerjakan 3 BE, bukan 2 — perlu pembagian task/branch yang jelas.
5. **Dependency yang tetap berlaku:** Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh.
6. Item lain yang masih berlaku dari Skenario A: mekanisme deteksi `ReferenceTransactionId` di Rilis 2 belum bisa diestimasi penuh; mapping BAPI ke SAP tetap di luar seluruh estimasi ini (dikoordinasikan client, PIC Faiza).
7. **Jadwal Rilis 2 tetap lebih ketat dari Rilis 1.** Buffer 1 minggu (3 Agustus 2026) cuma ditambahkan ke Rilis 1. Rilis 2 pakai estimasi shift-left + capacity check (13 Agustus 2026) tanpa margin ekstra tambahan di luar itu; kalau reallocation antar-thread (Risiko #9) atau shift-left QA sulit dieksekusi rapi, realistanya jadwal Rilis 2 bisa mundur lagi dari Minggu 19 (total >19 minggu).
8. **Risiko retest** kalau BE menyentuh ulang kode shared-screen (eMOL carry-forward, PoolingMOItem) **setelah** QA sudah mulai testing modul terkait duluan (Minggu 2 di Rilis 1, Minggu 9 di Rilis 2) — retest tambahan akibat perubahan itu belum terhitung eksplisit di estimasi ini.
9. **(Baru, 13 Agustus 2026, dikuantifikasi di revisi kedua) Tiga thread fitur bersamaan dengan hanya 3 BE.** Rilis 2 sekarang menjalankan Maintenance Activity Type + My Work + eMAR sekaligus. Jadwal di dokumen ini **sudah mengasumsikan reallocation aktif** (orang pindah bantu thread lain begitu thread-nya sendiri selesai — lihat tabel alokasi per-orang di Bagian 4.3), bukan silo 1 orang per fitur. Kalau reallocation ini tidak dikelola rapi di eksekusi riil, jadwal bisa mundur lagi dari Minggu 19.
10. **(Baru, 13 Agustus 2026) Confidence estimasi My Work & eMAR (113 SP) lebih rendah** dari Maintenance Activity Type. Maintenance Activity Type tervalidasi reference class Jira riil; My Work & eMAR murni estimasi dari desain di atas kertas, belum ada kode/mockup backend sama sekali. Beberapa keputusan yang bisa geser SP signifikan kalau berubah: push vs pull assignment dari Digiplan, arsitektur Management Dashboard (Power BI vs halaman app baru dengan RBAC), mekanisme reopen-editing setelah Reject di eMAR.
11. **(Baru, 13 Agustus 2026) Rilis 1 punya gap serupa (kecil) — bukan buatan sesi ini.** Kroscek kapasitas yang sama, diterapkan ke Rilis 1 (bagian dari rencana asli 3 Agustus 2026, bukan revisi baru): BE 43 SP diklaim selesai Minggu 3, tapi kapasitas riil 3 BE di ramp-up (0.81 SP/hari) untuk Minggu 1–3 cuma ~36.5 SP — realistanya BE selesai lebih dekat ke Minggu 4. Bedanya dengan Rilis

2: gap-nya kecil (~1 minggu) dan Rilis 1 sudah punya buffer 3 minggu QA sebelum ship (Minggu 4→7) yang kemungkinan besar menyerap slip ini. **Ship Minggu 7 tetap dipertahankan, tidak direvisi** — dicatat untuk transparansi metodologi.

Dokumen ini skenario final hasil diskusi bertahap dari *squad-baru-release-timeline.md* (Skenario A — 4 orang, 3 rilis sequential, 19 minggu). Dua skenario antara (gabung Rilis 1+2 dengan squad tetap, dan eksplorasi opsi headcount) sempat dibuat sebagai dokumen terpisah selama diskusi dan sudah digantikan oleh keputusan final ini. Rilis 2 direvisi 13 Agustus 2026 untuk memasukkan My Work & eMAR (161 SP total gabungan), lalu direvisi kedua kalinya di hari yang sama setelah capacity check per-orang — ship akhir **Minggu 19** — lihat Bagian 4 dan [squad-baru-release-timeline-final.md](https://claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204) untuk rincian lengkap. Gantt chart interaktif: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204.
